

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司

烟花爆竹仓库建设项目

安全验收评价报告

法定代表人：马 浩

技术负责人：彭呈喜

项目负责人：侯 英

二〇二二年十二月二十六日

评价人员

	姓名	专业能力	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	侯英	爆破技术	0800000000103231	003965	
项目组成员	喻荷兰	火炸药	1800000000201251	034105	
	孙洪杰	安全	S0110320001101930 00922	035769	
	刘家清	电气	S0110350001102030 01141	040561	
	董光	机械	1800000000301254	032850	
报告编制人	侯英	爆破技术	0800000000103231	003965	
	刘家清	电气	S0110350001102030 01141	040561	
报告审核人	邹文斌	安全	S0110320001101920 01449	024656	
过程控制负责人	朱细平	化工工艺	S0110350001102020 01361	027047	
技术负责人	彭呈喜	火炸药	0800000000101601	002717	

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司

烟花爆竹仓库建设项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

二〇二二年十二月二十六日

前 言

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司成立于2006年12月20日，法定代表人陈世勇。注册资本贰佰万元，主要承担泰顺县范围内烟花爆竹的批发经营业务，住所位于泰顺县雅阳镇新联村。

公司现有烟花爆竹仓库位于泰顺县雅阳镇埠下村，因原有库房建筑面积较小，不能满足企业的经营发展需要，现在泰顺县雅阳镇红朱田村境内新建1栋1.3级烟花爆竹库房（一期，危险等级为1.3级，最大存药量10t）及其辅助设施，目前已竣工。

我公司成立了项目组，并于2022年12月到现场进行了数据采集和资料收集。本次评价库区内外部距离、消防设施、建筑防火等级、防雷等主要依据《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161进行评价。该项目为烟花爆竹储存经营项目，将储存的烟花爆竹为爆炸品，不涉及危险化学品。另外根据GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》对该项目储存单元进行了重大危险源辨识，该项目储存单元不构成危险化学品重大危险源。

该公司烟花爆竹仓库储存条件、储存品种、周边环境等情况不发生变化的情况下，本报告有效期为叁年。

若企业后续违规超量储存（超过其承诺的限定1号仓库为10t），则本报告结论不成立。

关键词： 烟花爆竹 仓库建设 安全验收评价

目 录

1	安全评价概述	6
1.1	安全评价目的	6
1.2	安全评价原则	6
1.3	安全评价依据	7
1.4	安全评价范围	10
1.5	安全评价程序	11
2	评价项目的基本情况	13
2.1	企业概况	13
2.2	企业销售场所及储存场所周边环境	15
2.3	企业经营产品介绍	17
2.4	公用工程介绍	18
2.5	库区安全管理	20
2.6	企业烟花爆竹经营流程	22
3	主要危险有害因素的辨识与分析	25
3.1	危险、有害因素分析方法	25
3.2	烟花爆竹危险因素分析	25
3.3	储运过程危险因素分析	29
3.4	环境危险有害因素分析	32
3.5	人员因素危险性分析	34
3.6	重大危险源辨识	35
4	评价单元划分及评价方法选择	42
4.1	评价单元的划分	42
4.2	评价方法及选择	42
5	定性、定量评价	43
5.1	资料审核单元安全评价	43
5.2	总体布局和条件设施单元安全评价	44
5.3	现场检查单元安全评价	45
5.4	安全防护设施评价	48
5.5	周边环境危险性评价	49
5.6	重大事故模拟分析	50
5.7	重大事故隐患判定	53
5.8	安全经营条件评价	54
5.9	综合评价结果	55
6	安全对策措施及建议	57
6.1	安全对策措施、建议的依据及原则	57
6.2	补充的安全对策措施及建议	60
7	安全评价结论	64
7.1	项目主要危险、有害因素及事故种类	64
7.2	安全评价结果	64
7.3	评价结论	65
8	安全评价报告附件	67

1 安全评价概述

1.1 安全评价目的

安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，防止和减少事故的发生，保障烟花爆竹经营、储存企业的财产不受损失及员工的生命安全。安全评价应达到以下目的：

1、根据国家颁布的有关安全生产法律、法规、标准、规范，对该企业的烟花爆竹储存的环境条件和安全技术条件的符合性、满足性和有效性及安全管理现状进行现场检查和资料审查，通过评价完善整改，使之符合安全储存要求，为实现安全储存和管理的标准化、科学化创造条件。

2、采用安全系统的原理和方法，对评价范围内存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率及严重程度进行定性或定量分析和预测，针对事故发生的各种可能原因和条件，为企业提出消除或降低事故风险的安全措施与对策。通过安全评价来发现潜在的危险和隐患，为企业选择系统安全的最优方案和企业以及相关管理部门的安全管理工作提供科学依据。

3、了解和掌握事故发生的规律，预防事故的发生。

1.2 安全评价原则

安全评价工作以国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规、标准为依据，为建设单位或生产经营单位预防事故的发生，为政府主管部门进行安全生产监督管理提供科学依据。安全评价工作不但关系到被评价项目能否符合国家规定的安全标准，还关系到能否保障劳动者安全与健康的关键性工作。因此，安全评价必须以被评价项目的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃科学

的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务。在工作中必须自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则。

1.3 安全评价依据

1.3.1 法律法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第 88 号，2021 年 9 月 1 日起施行，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过）

2、《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第 28 号，2018 年 12 月 29 日修订）

3、《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日修正）

4、《中华人民共和国消防法》（国家主席令第 81 号，2021 年 4 月 29 日修订，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正）

5、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第 352 号，2002 年 4 月 30 日施行）

6、《工伤保险条例》（国务院令第 586 号，2011 年 1 月 1 日起施行）

7、《安全生产许可证条例》（国务院令第 653 号，2014 年 7 月 29 日施行）

8、《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第 666 号，2016 年 2 月 6 日修订）

9、《仓库防火安全管理规则》（公安部令第 6 号，1990 年 4 月 10 日颁布）

10、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第 24 号，2013 年 6

月 1 日起施行)

11、《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局令第 65 号，2013 年 12 月 1 日起施行）

12、《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号，2019 年 4 月 1 日起施行）

13、《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部令第 2 号，2019 年 9 月 1 日起施行）

14、《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安全生产监督管理总局令第 93 号）

15、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）

16、《烟花爆竹经营企业安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2006〕225 号）

17、《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（安监总管三〔2016〕62 号）

18、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第 80 号，2015 年 7 月 1 日施行）

19、《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作意见的通知》（国办发〔2010〕53 号）

20、《国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安委办〔2010〕30 号）

21、《浙江省安全生产条例》（浙江省第十二届人大常委会公告第 45 号，2016 年 8 月 1 日起施行）

22、《浙江省烟花爆竹安全管理办法(2015 年修正)》（浙江省

政府令第 266 号，2010 年 1 月 1 日施行)

23、《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作实施意见的通知》（浙政办发[2011]6 号)

1.3.2 安全生产监督管理部门关于烟花爆竹经营的有关要求

1、《浙江省烟花爆竹安全管理实施细则》(浙安监管危化[2016]97 号)

2、《浙江省安全生产监督管理局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹较大以上事故工作方案的通知》（浙安监管危化[2016]68 号)

3、《浙江省安全生产考试与证书管理实施细则》（浙安监管培〔2017〕80 号)

1.3.3 有关技术标准

- 1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
- 2、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
- 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版)
- 4、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
- 5、《烟花爆竹 安全与质量》GB10631-2013
- 6、《烟花爆竹 抽样检查规则》GB/T10632-2014
- 7、《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652-2012
- 8、《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022
- 9、《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995
- 10、《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986
- 11、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022
- 12、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008
- 13、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 14、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
- 15、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
- 16、《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008
- 17、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019
- 18、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007
- 19、《防止静电事故通用导则》GB12158-2006
- 20、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018
- 21、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013
- 22、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020
- 23、《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》GB/T 38315-2019
- 24、《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》AQ4101-2008
- 25、《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011
- 26、《烟花爆竹防止静电通用导则》AQ 4115-2011
- 27、《烟花爆竹流向登记通用规范》AQ4102-2008
- 28、《安全评价通则》AQ8001-2007
- 29、《安全验收评价导则》AQ8003-2007
- 30、《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标 125-2009）
- 31、《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008

1.3.4 技术文件、参考资料

- 1、泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司提供的项目基础资料。

1.4 安全评价范围

受泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司的委托，本次评价范围包括泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司位于泰顺县雅阳镇红朱田村烟花爆竹库区外部环境状况、内部平面布置、储存条件、仓库建筑结构、安全设施及仓库的安全管理。基本内容为：

1、《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规规定的安全经营条件。

2、《烟花爆竹安全与质量》、《烟花爆竹抽样检查规则》、《烟花爆竹作业安全技术规程》、《烟花爆竹工程设计安全标准》、《烟花爆竹经营许可实施办法》等国家标准规定的安全储存条件。

对于库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价范围，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震（设防等级）、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的范围。本报告中关于环保和消防方面的叙述，不能替代相关政府行政部门的审核审查意见，企业应取得相关部门的审核审查意见。

涉及项目职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不予评价。

本报告评价结论是在1号1.3级仓库核定药量为10t得出的，若企业后续违规超量储存，则不在本报告评价范围内，本报告评价结论不成立。

1.5 安全评价程序

安全评价报告编制程序如下：

1、根据被评价单位的委托书，搜集企业的相关资料 and 文件。

- 2、与被评价单位签订安全评价合同。
- 3、组建安全评价小组，现场勘查，了解被评价单位及项目情况。
- 4、编制安全评价报告。

2 评价项目的基本情况

2.1 概况

2.1.1 企业概况

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司(以下简称公司)成立于2006年12月20日,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本贰佰万元整。经营许可证的经营范围:组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹(C)级。

公司概况见表2-1。

表2-1 企业概况表

名称	泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司		
住所	泰顺县雅阳镇新联村		
新建储存库区地址	泰顺县雅阳镇红朱田村		
法定代表人	陈世勇		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
烟花爆竹经营(批发)许可证	有效期:2021年1月26日至2024年1月25日		
	许可经营范围:组合烟花类(C、D)级、玩具类(C、D)级、吐珠类(C)级、升空类(C)级、旋转类(C、D)级、喷花类(C、D)级、爆竹(C)级,温州市应急管理局		
项目联系人	陈世勇	联系电话	13750917777

2.1.2 建设项目概况

公司现有烟花爆竹仓库位于泰顺县雅阳镇埠下村,因原有库房建筑面积较小,不能满足企业的经营发展需要,现在泰顺县雅阳镇红朱田村境内新建1栋1.3级烟花爆竹库房(一期,1号仓库)及其辅助设施。

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库新建项目于2022年3月25日通过泰顺县应急管理局组织的《安全设施设计》审查,审查核定的建设规模为一座烟花爆竹仓库,其中1号仓库危险等级1.3

级，建筑面积713.26m²，计算药量为10t。具体详见《泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全设施设计安全审查意见书》（温烟爆安设审字[2022]1号）。

库区内新建烟花爆竹仓库一座，危险等级为1.3级，计算药量为10000kg。库房总用地面积约2666m²，总投资额约408万。该工程于2022年6月13日办理建筑工程施工许可证（编号330329202206130101）并开工，于2022年12月全部竣工。

企业新建仓库评价和设计单位情况见表 2-2。

表 2-2 新建仓库评价和设计单位基本情况

项目	单位名称	单位资质
项目建设单位	泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司	烟花爆竹经营许可证：（浙）PF（2021）00022 号
项目设计单位	浙江天成工程设计有限公司	资质等级：化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运、化学原料药）专业甲级。
项目评价单位	南京理工中爆安全科技有限公司	业务范围：第一类：……烟花爆竹制造业。
施工单位	温州华锐建设有限公司	建筑工程施工总承包叁级
监理单位	同舟国际工程管理有限公司	可承担专业工程类别建筑工程项目的工程监理业务

表 2-3 项目实施情况表

序号	进展项	相关单位	时间
1	规划条件	泰顺县自然资源和规划局	2021.8.25
2	投资备案登记	泰顺县发展和改革局	2021.10.19
3	建设用地规划许可证	泰顺县自然资源和规划局	2021.12.23
4	建筑工程施工许可证	泰顺县住房和城乡建设局	2022.6.13
5	安全预评价	南京理工中爆安全科技有限公司 (APJ-(苏)-009)	2022.1
6	安全设施设计专篇	浙江天成工程设计有限公司 (甲级 A133011387)	2022.4
7	安全设施设计审查意见书	温州市应急管理局	2022.4
8	防雷检测	常州市防雷设施检测所有限公司	2022.12.8
9	防静电检测	常州市防雷设施检测所有限公司	2022.12.8

10	建筑消防设施检测报告	浙江智科工程检测有限公司	2022.12.9
11	建设工程消防验收意见书	泰顺县住房和城乡建设局	2022.12.20
12	浙江省建设项目规划土地核实确认书	泰顺县自然资源和规划局	2022.12.20
13	竣工验收备案表	泰顺县住房和城乡建设局	2022.12.22

根据《浙江省烟花爆竹建设项目安全监督管理规定》（浙安监管危化〔2011〕41号），建设单位应当委托具有民爆或化工设计资质的单位进行设计，设计单位浙江天成工程设计有限公司资质符合要求。本项目按设计施工，无设计变更内容。

2.2 企业储存场所布局

2.2.1 周边环境

该项目新建库区位于泰顺县雅阳镇红朱田村境内一缓山坡上一处平坦地带，场地地理坐标为东经 120°5'5.44"，北纬 27°26'12.69"，库区东面为缓山坡，山坡上有树林，村道从库区外西面绕至南面，道路外侧为山沟，东面近处有山沟。库区外南向的 10kV 电力线已断电，库区东南角山路边有一搭棚，未住人。

库区西北面：有村庄（红朱田村-大山）；

库区北面：有本单位办公楼（含值班室）；

库区西南面：零散住户；

库区东面：有邱氏宗祠；

库区周围未发现其他需保护目标。

此外，安全距离内无其它企业、学校、城镇规划区、铁路中间站、变电站等。库区各建构筑物及外部距离具体间距见下表。

表2-4 库区各建构筑物及外部距离一览表 单位：m

序号	建筑物名称	危险等级	计算药量 (kg)	周边建（构）筑物	GB50161-2022 要求的最小允许距离 (m)	实际距离 (m)

1	1号仓库	1.3	10000	东面	50人以下零散住户 (邱氏宗祠)	78	123
				西南面	50人以下零散住户 (土地宫)	78	112
				西北面	10kV 架空电力线	35	78
				北面	50人以下零散住户 (企业自用的办公楼)	78	83
				北面	村庄边缘 (红朱田村-大山)	110	171

2.2.2 总平面布置

库区总用地面积5980m²，建有713.26m²（1.3级）仓库一座、消防泵棚（40m²）一座、消防水池（120m²，有效容积大于270m³）一座、办公室一座（三层，占地98.15m²）。

本项目库区总平面呈“刀把”形，库区设置密砌围墙，围墙高度2m，围墙与仓库之间的距离不小于5.5m。库区大门朝西南，位于西南面围墙北端；另一个通往办公室的人员出入口位于东北侧围墙的北侧。新建的1号仓库位于库区西南部，消防水池、消防泵棚位于库房东北侧，消防泵棚联建在消防水池的西北侧。办公楼（含值班室）位于库区外北面。库区设视频监控探头、防雷防静电系统、人体静电导除设施（整改后已增设）、值班室、消防泵系统。

仓库耐火等级为二级，地基设有防潮层，水泥地面。具体见表2-5。

表 2-5 烟花爆竹库房情况调查表

项 目	烟花爆竹 1 号仓库
库房编号	1 号
建筑结构防火等级	二级
总层数	一 层
结 构 类 型	墙体砖混、钢筋混凝土框架、钢檩条（刷防火涂料）结构， 岩棉夹芯彩钢板屋面
基 础 类 型	钢筋混凝土结构
危险等级	1.3 级

最大允许存药量, t	10
库房尺寸 (长×宽×高) m	35.24m×20.24m×4.5m (檐口高)
建筑面积m ²	713.26
防火分区面积m ²	2个防火分区, 356.6
安全出口	8个, 每个防火分区各4个
安全疏散口最远距离	小于15m
库门结构	外开门, 防火门, 门洞宽约2.1m
通风设施	仓库上下分别设置通风窗和进风窗, 上侧通风窗配置铁栅、密格金属网、下侧通风窗为百叶通风窗和密格金属网

2.2.3 储存能力

各库储存能力见表2-6。

表2-6 烟花爆竹库房药量表

库区/仓库	贮存产品类别	库房占地面积 S (m ²)	最大存药量 W(t)
1号仓库	C、D级烟花产品 (仅限个人燃放) C级爆竹类产品	713.26	10

2.3 企业经营产品介绍

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹的主要供应商为江西、湖南等定点生产企业生产的产品, 见表2-7、2-8。烟花爆竹由供货商委托具有危货运输资质的单位、车辆、人员送到公司仓库, 仓库保管验收入库; 泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹的批发销售区域为泰顺县范围内, 销售时公司通过厢式货车运送到销售点。公司目前未仓储烟花爆竹, 但拟订货的供货单位见表2-7。

表2-7 烟花爆竹批发单位主要供货方清单

序号	供货方名称	主要负责人	许可产品范围	安全生产许可证号
1	湖南庆泰烟花制造有限公司	黄文福	礼花类 (小礼花, B级)、组合烟花类 (B、C级)、喷花类 (A、B、C、D级)	(湘)YH安许证字 [2022]019053号
2	浏阳市北斗烟花制造有限公司	陈刚	组合烟花类 (单筒药量<25g, C级)、喷花类 (B、C、D级)、吐珠类 (C级)、旋转类 (C、D级)、升空类 (火箭、C级)	(湘)YH安许证字 [2021]011887号

3	上栗华良花炮制造有限公司	吴佑明	产品类别：爆竹类、引火线生产； 产品分级：C级；产品分类：C级 爆竹类、引火线（仅限自产自用）	(赣)YH安许证字 [2022]060354号
---	--------------	-----	---	----------------------------

说明：上表所列的单位为主要的供货单位，并不是唯一指定的供货单位，公司均经有资质的生产厂家进货。

表 2-8 储存产品一览表

产品级别	产品类别
C级	爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类
D级	喷花类、旋转类、组合烟花类、玩具类

2.4 公用工程介绍

1、消防

库区设置一个有效容积大于 270m³ 的消防水池作为消防水源，配备两台流量 90m³/h、扬程 42m、功率 18.5kW 的电动消防水泵，并设置一套增压稳压设施，控制消防压力不低于 0.38MPa。消防管网为环状，管径 DN125，管材选用钢丝网骨架塑料复合管，消防管网覆盖范围内设置三支地上式室外消火栓（其中二个设烟花爆竹库区内，一个设在办公楼区域）。

消防补充水引水管采用 DN100 钢丝网骨架塑料复合管，通过水泵将水塘储水引入。库区北面约 130m 处有一个溪流汇集的蓄水水塘，占地约 750m²，蓄水量不小于 500m³，周围汇水面积较大，水源丰富。水泵流量 25m³/h，引水管长度约 140m，可以满足补水时间不超过 48 小时要求。

库区配备 5kg 干粉灭火器 16 只、35kg 推车式干粉灭火器 2 只，办公室配备 4kg 干粉灭火器 6 只。

2、供电

库区消防和生活供电由当地城市电网供电。

3、供水

烟花爆竹库区用水主要是管理人员生活用水。库区按职工 8 人考虑，其生活用水按平均 50L/人·天计算，生活用水量为 146t/a。项目生活用水量不大，直接接自当地自来水给水管网。

4、通信和防盗报警

在库区烟花爆竹仓库四周设置了视频监控摄像头 9 个，主机设置在值班室内，分辨率 2304*1296，4 个硬盘总容量 10TB，存储时间约为 42 天。库区值班室设火灾报警专用电话，电话号码为 0577-67668666，值班室人员配备移动通讯设备保持有外界的联系。库房装卸门设置有入侵报警系统（采用门磁传感器和红外对射报警器）。

5、防雷、导静电

烟花爆竹仓库区已安装避雷装置及导静电装置。烟花爆竹仓库的防雷类别见表 2-9。

表 2-9 仓库的防雷防静电检测

序号	库房名称	危险等级	危险场所类别	防雷类别	备注
1	烟花爆竹 1 号	1.3	F1	二	防雷设施由常州市防雷设施检测所有限公司检测合格，并提供检测检验报告。报告编号：常雷检（温）[2002]0341 号，检测有效期至：2023 年 12 月 6 日。防静电接地设施由常州市防雷设施检测所有限公司检测合格，并提供检测检验报告。报告编号：常雷检（温）[2002]0342 号，检测有效期至：2023 年 6 月 6 日。

根据常州市防雷设施检测所有限公司出具的防雷防静电接地检测合格报告得知，项目执行第二类防雷措施，设置了避雷带和静电触摸球，被保护的建筑物完全处于保护范围内，检测结论为“符合规范

要求”，防雷检测报告于 2023 年 12 月 6 日到期，防静电接地检测报告于 2023 年 6 月 6 日到期。

6、配送运输

公司入库运输车辆均为配送厂家委托有资质单位进行配送到库房；企业烟花爆竹货品配送运输委托宜春龙达物流汽车运输有限责任公司运输，并签订运输委托协议，在协议中明确双方责任。宜春龙达物流汽车运输有限责任公司经营范围为危险货物运输，于 2022 年 3 月 3 日取得由宜春经济开发区行政审核局核发的中华人民共和国道路运输经营许可证（证书编号：赣交运管许可宜字 360900211501 号，有效期至 2026 年 3 月 3 日），该运输公司资质符合烟花爆竹经营运输资质及配送服务能力。

2.5 库区安全管理

该公司主要负责人、安全管理人员和烟花爆竹储存作业等人员已报名参加了当地应急管理部门组织的安全教育培训，并持证上岗。

根据《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》的有关法律法规，公司制定了各类人员职责、各项安全管理制度和安全操作规程（具体见表 2-11）。该公司法定代表人陈世勇是公司安全第一责任人，对各项制度的执行情况进行检查并实施奖惩；公司重视对从业人员的安全教育培训，提高从业人员知识水平；企业提供了按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制的《泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司生产安全事故应急救援预案》（位于泰顺县雅阳镇红朱田村境内），于 2022 年 12 月 19 日在泰顺县应急管理局备案。库区配备了必要的应急救援人员和器材；库房配备干湿、温度计及登记记录，检查时通风窗金属防护网完好。

公司为从业人员办理了社会保险（8 名职工缴纳了工伤保险），

由浙江省社会保险出具了相关凭证；且办理了安全生产责任险，由中国平安财产保险股份有限公司提供了相关凭证，详见附件。

表 2-10 人员培训情况表

姓名	证件类型	证号	证书有效期	发证机关
陈世勇	主要负责人	330324197412194194	2024-01-14	温州市应急管理局
欧淑娟	主要负责人	330329198107102886	2025-11-30	温州市应急管理局
欧娟斯	安全生产管理人员	330329198301012833	2025-12-22	温州市应急管理局
毛方河	安全生产管理人员	330329198605162830	2025-11-30	温州市应急管理局
黄向熙	烟花爆竹安全作业	T330323197709135738	2026-10-22	浙江省应急管理厅
陈何妃	烟花爆竹安全作业	T330324197606174183	2026-6-16	浙江省应急管理厅
陈晓飞	烟花爆竹安全作业	T330324197812044187	2026-10-22	浙江省应急管理厅

注：企业任命了欧娟斯为专职安全管理员。

表 2-11 安全管理制度及操作规程目录

序号	安全管理制度	序号	安全管理制度
1	主要负责人安全生产责任制	24	烟花爆竹回收管理制度
2	安全管理人员安全生产责任制	25	烟花爆竹入库验收管理制度
3	保管员、守护员、装卸员、驾驶员、押运员安全职责	26	烟花爆竹销售管理制度
4	安全生产目标管理制度	27	烟花爆竹保管管理制度
5	违规违章行为处罚制度	28	烟花爆竹道路运输许可证管理制度
6	安全生产检查制度	29	专用封签、防伪码标签管理制度
7	安全生产监督和保证制度	30	安全会议制度
8	安全设施、设备管理制度	31	安全事故管理制度
9	烟花爆竹仓库消防安全制度	32	安全管理绩效考核制度
10	事故隐患整改制度	33	烟花爆竹质量产品管理制度
11	库区防火（动火）管理制度	34	烟花爆竹产品储存管理制度
12	从业人员安全教育培训制度	35	仓库人员和车辆进出库管理制度
13	安全投入保障制度	36	仓库监控管理制度
14	仓库安全标识管理制度	37	烟花爆竹配送运输管理制度
15	仓库外来人员管理制度	38	仓库、库区值班管理岗位制度
16	批发销售部门岗位安全责任制	39	不合格产品处置管理制度
17	门卫、守护人员安全责任制	40	经营场所样品摆放管理制度
18	防护用品（具）管理制度	41	防火防爆安全管理制度
19	安全生产费用提取制度	42	安全检查和隐患排查治理制度
20	员工考勤与违规违章处罚制度	43	仓库安全管理制度

21	购销合同管理制度	44	企业负责人值带班制度
22	烟花爆竹流向登记管理制度	45	事故应急救援与报告制度
23	烟花爆竹购买管理制度		
安全操作规程			
1	烟花爆竹检验验收操作规程	4	驾驶押运安全操作规程
2	烟花爆竹拆箱操作规程	5	仓库保管安全操作管理规程
3	烟花爆竹装卸搬运安全操作规程		

2.6 企业烟花爆竹经营流程

2.6.1 入库工艺流程

工艺简述：运送烟花爆竹的车辆进入库区应安装防火罩，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下，再将烟花爆竹搬运至仓库，并按规定进行堆垛码放。

公司烟花爆竹入库工艺流程示意图如下：

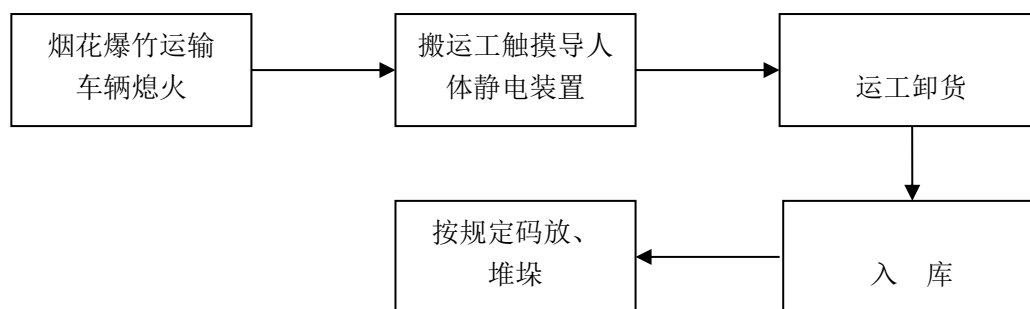


图 2-1 烟花爆竹入库工艺流程图

2.6.2 配送工艺流程

工艺简述：配送烟花爆竹的车辆进入库区应安装防火罩，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的

静电导入地下,再将烟花爆竹从仓库内搬运至配送车辆上,装车完毕,应在专人引导驶出库区。配送车辆在配送过程中不得抢道、超速,按规定路线行驶并保持车距。到达具有零售资质的经营户地址后,由经过培训的配送工分发给经营户。

公司烟花爆竹配送工艺流程示意图如下:

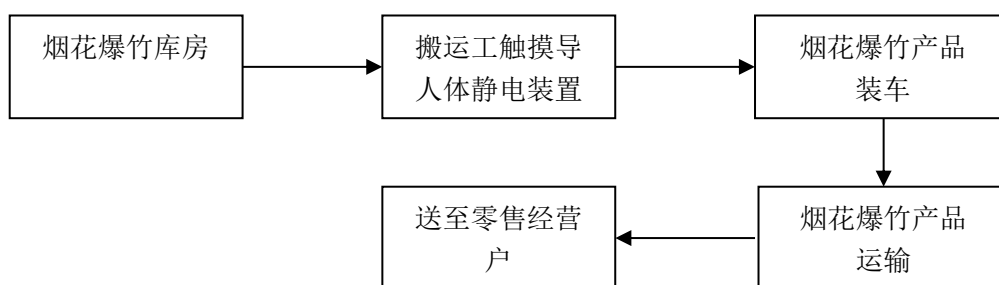


图 2-2 烟花爆竹配送工艺流程图

2.6.3 配送车辆

公司入库运输车辆均为配送厂家委托有资质单位进行配送到库房;企业烟花爆竹货品配送运输委托宜春龙达物流汽车运输有限责任公司运输,并签订运输委托协议,在协议中明确双方责任。宜春龙达物流汽车运输有限责任公司经营范围为危险货物运输,于2022年3月3日取得由宜春经济开发区行政审核局核发的中华人民共和国道路运输经营许可证(证书编号:赣交运管许可宜字360900211501号,有效期至2026年3月3日),该运输公司资质符合烟花爆竹经营运输资质及配送服务能力。

2.6.4 库区道路

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司与库外道路相通,交通便利、畅通。库区内运输通道宽约5m,可满足运输车辆及消防、急救车辆运输需求。

2.6.5 防护屏障

1号仓库为1.3级库，库房与办公室（含值班室）之间不涉及防护屏障。

2.6.6 其他安全设施

已按照AQ4114标准设置了安全标志标识，主要包括有限速、防火、禁烟标志，持证上岗、防雷电、防静电、禁穿钉鞋、禁穿化纤衣服、禁止超员作业等一系列安全警示标志。

3 主要危险有害因素的辨识与分析

3.1 危险、有害因素分析方法

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，统称为危险因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。危险、有害因素的分析辨识是建立在现场考察和资料分析的基础上进行的，危险、有害因素的分析辨识是安全评价的基础。因此，在现场考察和资料分析的基础上，对公司烟花爆竹经营、储存过程中及其附属设施所存在的主要危险、有害因素采用如下分析方法。

1、根据烟花爆竹药剂的物化性质，对其固有的危险性进行定性分析。

2、根据国家标准 GB50161《烟花爆竹工程设计安全标准》相关规定，对库区总平面布置、内外部距离进行定性、定量分析。

3、对公司烟花爆竹储存过程中的滞药量进行重大危险源辨识，按 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》进行定量分析。

3.2 烟花爆竹危险因素分析

烟花是指燃放时能形成色彩、图案，产生音响等，以视觉为主的产品。爆竹指燃放时能产生爆音、闪光等，以听觉效果为主的产品。

烟花爆竹主要物料有氯酸钾（现已禁用）、高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、氧化铅、木炭、硫、硫化锑、漆片、酚醛树脂、铝粉、铁粉、钛粉、镁铝合金粉及着色剂碳酸锶、草酸钠、氧化铜和少量特殊效应

物质、含氯有机物、溶剂等。这些物料中既有氧化剂又有还原剂和着色剂，在受热、摩擦、撞击、接触明火、吸湿受潮，或者在一定条件下氧化剂与还原剂混合时，均有可能引起燃烧爆炸。

公司主要经营组合烟花及中、小爆竹等，成品因经过包装及装箱后，相对原料及半成品的危险性降低，但仍存在因仓库超量贮存、分类存放不能达到安全间距、贮存的物质条件与技术条件可靠性不足（如缺少防止小动物进入仓库内啃咬及防潮措施）、成品装卸作业违章操作、仓库管理人员安全素质低、厂内运输工具缺陷等均有引起成品燃烧和爆炸危险。另外由于仓库安全距离不够或防护屏障不全有造成事故扩大的可能。

导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果极为严重，不仅会造成仓库损毁、财产损失，而且易造成人员伤亡。烟花爆竹产品在储存过程中发生火灾爆炸的原因主要有：

1、明火

由于外来人员、搬运人员或其他进入仓库的人员携带火种，违章吸烟，或外来火源等易发生火灾；围墙外燃放烟花爆竹造成也会出现明火；若仓库安装照明线路，当电气线路老化、接触不好引起打火、照明灯具、开关不防爆等电气火花也可引起仓库发生火灾爆炸。

2、雷电危害

雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电




图 3-1 烟花爆竹仓库引爆的因果分析图

5、爆炸危害

烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：

1) 直接的破坏作用。厂房建筑、设备等爆炸后产生许多碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。

2) 冲击波的破坏作用。物质爆炸时，产生的高温高压气体以极高的速度膨胀，像活塞一样挤压周围空气，把爆炸反应释放出的部分能量传递给压缩的空气层，空气受冲击而发生动扰，使其压力、密度等产生突变，这种扰动在空气中传播就形成冲击波。冲击波的传播速度极快，在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备建筑物产生破坏作用和人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。冲击波的破坏作用主要是由其波阵面上的超压引起的。在爆炸公司附近，空气冲击波波阵面上的超压可达几个甚至十几个大气压，在如此高的压力作用下，建筑物被摧毁，机械设备、管道等也会受到严重破坏。当冲击波大面积作用于建筑物时，波阵面超压在 20~30kPa 内，就足以使大部分砖木结构建物受到严重破坏。超压在 100kPa 以上时，除坚固的钢筋混凝土建筑外，其余部分将全部破坏。

3) 造成火灾。爆炸发生后，产生的高温、高压，建筑物内遗留大量的热或残余火苗，不仅会对仓库本身造成危害，还会把库区周围

的杂草引燃，导致火灾。

4) 造成中毒和环境污染。在烟花爆竹大量的爆炸过程中，产生的硫化物、氮氧化物烟雾对环境会造成污染。

3.3 储运过程危险因素分析

3.3.1 储存过程危险因素分析

1、由于库区选址不当，烟花爆竹仓库的外部、内部安全距离不符合要求等原因，储存过程中发生火灾、爆炸事故，会对库区周围人员及库区内作业人员造成人员伤亡、财产损失。因此库区的选址必须符合国家标准的相关规定，内、外部安全距离和安全间距必须符合《烟花爆竹工程设计安全标准》的要求，使人员和危险源保持隔离，降低危险性。

2、建筑物的防火等级不够，设计不规范，直接影响人员的撤离和造成二次事故。

3、明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质，由于吸烟、取暖、飞火等原因，易引发爆炸事故。

4、受太阳直射、局部热量聚集，当达到一定温度时，引起火药的自燃，产生明火导致爆炸事故。

5、产品质量不合格，使用了违禁原料，或产品过于敏感，在正常的储存条件下引发事故。

6、烟花爆竹仓库相应较独立，要做好防雷电设计，并采取有效避雷措施，防止雷电造成的燃烧、爆炸事故的发生。

7、烟花爆竹仓库的照明、开关、线路都会产生电气火花，如果

没有安装电气线路，临时使用的照明灯具也可能产生火花。

8、静电起火，烟花爆竹在作业过程中产生的静电积聚和人带有静电，无消除静电装置接地造成静电积聚放电。

9、潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

3.3.2 运输过程危险因素分析

1、在库区内的运输采用人力和手推车运输，在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸。

2、在物料的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸。

3、运输过程中运输时，若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

4、在运输时，司机和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

5、禁忌性物料混运，一旦泄漏相遇，会发生燃烧、爆炸等事故。

6、运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

7、产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

8、运输的线路必须按照公安部门指定的线路，避开人员稠密区和重要场所。

9、运输车辆停靠时要加强监管，防止事故的发生。

10、使用非危险化学品车辆进行运输，极易造成事故的发生。

3.3.3 装卸过程危险因素分析

烟花爆竹在装卸搬运过程中，不严格执行操作规程，发生撞击、坠落、摩擦、倾斜重压，滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起产品的燃烧爆炸。

3.3.4 其它危险性分析

1、物体打击

烟花、爆竹堆垛过高、堆放方式不符合标准，发生倒塌，易发生货物倾倒造成物体打击事故。

2、电气危害

值班室及库外电源线路，当电线裸露、电器设备漏电或带电检修设备时，可导致触电事故发生。

3、中毒

烟花爆竹使用的火药属于有毒物品。此类物品经吸入、食入、经皮吸收会对人的神经中枢系统有麻醉作用，对上呼吸道、皮肤、肾脏、粘膜等人体各器官有刺激作用，引发各种疾病；短时间内吸入较高浓度时可引起急性中毒，出现眼及呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及头晕、头痛等症状。

4、车辆伤害

库内运输车辆在运输装卸过程中，由于驾驶操作不当或车辆故障，将会导致车辆伤害，甚至引起烟花爆竹的火灾和爆炸事故。

5、溺水

库区设有消防水池，如果消防水池防护设施不完善易造成人员溺水事故。

6、高处坠落

在对烟花爆竹屋顶进行检查和维修时，作业人员安全意识不强、脚手架安装不良等原因，可能导致高处坠落事故发生。

3.4 环境危险有害因素分析

3.4.1 自然条件危险因素分析

自然条件的影响主要指气候等方面的影响。本节着重分析雷电、高温和潮湿等因素对本项目的影响。

1、雷电

雷电可能触发烟花爆竹火灾爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹行业安全生产的重要因素之一。由于雷电的不确定性，易在防雷设施设置不到位的部位发生直击雷或感应雷雷击事故，引起火灾爆炸。因此烟花爆竹库房的防雷设计应严格按照规范进行，选择可靠的避雷方式、接地电阻、安全间距等，有效防止直击雷与感应雷。

2、高温

高温容易引发火灾，特别是在高温、潮湿天气，储存的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾事故。该项目所在地区属大陆性气候，四季分明，夏季炎热，当夏季环境温度过高时，库内温度升高易发生火灾事故。

3、潮湿

烟花爆竹产品内含有铝粉等物质，这些物质遇湿易产生氢气并放出热量，导致火灾事故。因此仓库必须要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇潮湿发热，引发燃爆事故。

4、台风

本库区处于台风易发区，经常受到台风影响。台风会造成库房倒塌及库区进水事故从而引发自燃爆炸、撞击爆炸等事故。本地区又是一个多雷暴地区，设备设施易遭雷击而发生火灾爆炸等自然灾害的发生。

3.4.2 周边环境危险因素分析

仓库与周边的居住区安全间距符合要求，库区周边活动人员主要是周边山地流动人员，此外，无对库区造成危害的危险源。

1号库的东侧围墙为山体，山上生长有杂草树木，应对围墙外侧的杂草枯枝定期清理。库房离围墙间距大于5m，为防止围墙外有火星等传入库房，库房此墙不宜开设门洞和窗户，但因库房通风需要，库房面向围墙侧设置了上下侧通风窗。库房窗户设置了密格铁丝网等防火措施。外部人员在库外使用明火如防火措施不到位，极易进入库房进而导致库房内的烟花爆竹燃烧爆炸。

无关人员、车辆在库区附近逗留或给库区带来火源，企业应加强对库区周围外界人员逗留等环境的监督，加强库区内安全管理，防止库区内外因素相互影响而导致事故发生。库房与围墙间距大于5m，应注意加强防火工作，及时清除围墙内外一定范围内的干枯杂草、落叶。

3.5 人员因素危险性分析

作业人员是否遵章守纪及公司安全管理水平的高低是实现烟花爆竹仓库安全运行的主要因素之一，在日常生产中人的不安全行为及安全管理不规范是引发事故主要的危险有害因素。

人的不安全行为主要表现为：

1、违章使用明火，违章携带手机等易发生静电和火花的工具进入库区。

2、进入仓库的人员穿戴不防静电的衣物和钉底鞋。据测量，一个普通男子站在绝缘地板上脱化纤毛衣时，人体静电电位可达 8200 伏，起电量为 0.95 微库，积累的静电能力为 3.9 毫焦。这个能量比黑火药的最小静电点火能 0.19 毫焦大 20 倍。如果发生静电放电火花，就会引起爆炸事故。穿硬底、钉底鞋时，散落在地上的烟火药能被行走时的摩擦力引燃起爆。

3、操作不规范：

违规使用铁制工具。铁器冲击、碰撞时产生火花，可引爆烟火药。

错误操作，忽视安全，忽视警告。装卸作业中，碰撞、拖拉、翻滚、倒置以及剧烈振动等，都可引起火灾爆炸事故。

操作、搬运过程中堆垛过高、过密造成倒塌。

4、库房内人员集中，限制库房内的人员是为了限制发生爆炸事故时造成大量的人员伤亡。

5、使用不安全设备，人为造成安全装置失效。

安全管理不规范主要表现在：

- 1、仓库设计上存在缺陷，未能实现本质安全化设计。
- 2、公司对员工的教育培训不够，未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识。
- 3、劳动组织不合理，对现场作业缺乏指导、检查或指导错误。
- 4、没有或不认真执行实施事故防范措施，存在侥幸心理，对事故隐患整改不力。

3.6 重大危险源辨识

3.6.1 重大危险源辨识方法

重大危险源辨识的依据为国家标准 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》。重大危险源的辨识指标有两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按公式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源。

$$q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n \geq 1 \quad (1)$$

式中： q_1, q_2, \dots, q_n ——每种危险化学品实际存在量，t。

Q_1, Q_2, \dots, Q_n ——与各危险化学品相对应的临界量 t。

3.6.2 危险物质临界量标准

企业在库区中涉及的主要危险物质有烟花和爆竹。根据国家标准 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》规定，W1.2 爆炸品的临界量为 10t，W1.3 的其他爆炸品的临界量为 50t。

3.6.3 企业危险物质数量的确定

根据库房内各品种的最小经营单位含药量、每箱货品中最小经营单位数量和该品种箱数的乘积予以连加，即为库区内药量总和。如下式：

$$Q = \sum_{i=1}^n q_i \times a_i \times b_i$$

Q ——库区总药量；

q_i ——某品种最小经营单位含药量；

a_i ——每箱货品中最小经营单位个数；

b_i ——该品种库存箱数。

该企业的最大库存量见表 3-1。

表 3-1 危险物质的数量

物质名称	仓库等级	危险物质量（吨）	最大临界量（吨）	$\Sigma q_i/Q_i$
1号仓库烟花和爆竹	1.3	10	50	0.2<1

3.6.4 重大危险源辨识结果

经辨识，该企业在各仓库区中涉及的烟花爆竹的最高储存量未超过国家标准 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》规定的重大危险源的临界量，仓库未构成危险化学品重大危险源。但企业仍需高度重视对烟花爆竹的安全管理，制定应急救援预案，采取严格措施预防和控制烟花爆竹发生燃烧、爆炸事故。

3.6.5 特殊化学品辨识

本企业未涉及易制毒、易制爆、剧毒、监控、重点监管和特别管控危险化学品。

3.6.6 特种设备辨识

本企业未涉及叉车、行车等装卸转运或其他特种设备。

3.6.7 事故案例分析

1、贵州毕节地区大方县供销社日杂公司花炮厂装载烟花时发生爆炸，2人死亡

事故经过：2003年8月2日12时10分，贵州毕节地区大方县供销社日杂公司花炮厂在装载烟花爆竹过程中发生爆炸，造成2人死亡、4人受伤、10人轻伤。

事故原因：经调查组分析，是由野蛮装卸的撞击而引发了事故。

预防措施：加强安全管理，严格装卸、搬运、运输安全操作规程。

2、巴基斯坦一码头因烟头随手丢入爆竹中发生花炮爆炸，造成17人死亡

事故经过：2003年2月4日，巴基斯坦东部锡亚尔科特港一个装满烟花爆竹的集装箱突然起火爆炸，造成17人死亡，多人受伤。

事故原因：据当地警方介绍，当日下午工人在正在码头将准备运往拉合尔的花炮装入2个大集装箱，花炮突然起火引发连串爆炸。燃放的花炮蹦落到附近的屋顶及码头附近的学校内，引起火灾。爆炸共造成17人死亡，其中多数为码头工人，还有2名刚放学的小学生。花炮爆炸还造成20多人重伤。爆炸原因是工人将烟头随手丢入爆竹中引起的。

预防措施：健全安全管理制度，制定教育培训计划，加强组织安全教育培训，增强员工安全意识，在码头装运烟花爆竹时，做好安全

全警戒、防止非工作人员进入。

3、印度尼西亚公交车因发动机高温引发烟花爆炸，10人死亡

事故经过：2002年8月23日，印度尼西亚西瓜哇省一辆满载乘客的公交车发生烟花爆竹爆炸，造成公交车失火并爆炸，致使10人死亡、20多人受伤。

事故原因：当时车上共有60名乘客，1名乘客携带5大袋易燃易爆的烟花爆竹，上车后随手把包裹放到发动机上，结果发动机高温引燃了烟花，酿成悲剧。

预防措施：严禁携带烟花爆竹乘车，增强驾驶员安全意识。

4、直击雷烧毁成品库产品

事故经过：2005年4月，上栗县二出口花爆企业成品仓库在同一天下午，时间相差不到2个小时，两个花爆企业的成品仓库雷击引发了燃烧事故，其中也含部分B级罗马烛光(拉手)产品，但未引发爆炸，仓库所有产品燃烧殆尽，损失近100万元。

事故原因：成品仓库未安装避雷针，导致直击雷击中成品起火。B级罗马烛光(拉手)产品未引发爆炸，事后专家分析，是该产品新增的铁丝网包装起了关键作用，从现场找到的罗马烛光(拉手)燃烧残留物分析，局部产生了高温点，坚固的发射筒扼致了药剂爆炸。

预防措施：雷电是自然界的一种静电现象，雷击对地面造成的危险主要是对物体和人身伤害两方面。雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库

缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用避雷针，接地电阻应 $\leq 10\ \Omega$ ，定期检查测试，防止雷电危害。

5、静电引起燃烧烧毁成品库产品

事故经过:2004年11月，河南省某经营公司成品仓库在开箱验货时，将产品引燃，引发了燃烧事故，整幢仓库产品被烧毁。

事故原因：成品仓库门前未安装导静电设备，北方气候干燥，员工身上静电电压很高，验货开箱后，在接触产品时对产品产生了静电放电，静电火花导致成品起火。

预防措施:在烟花爆竹装卸作业中，如果作业人员不按规定穿戴抗静电服装，会在作业人员身上积聚大量的静电电荷，产生静电火花或达到引燃、引爆药剂的临界量时，就容易引起烟花爆竹的燃烧或爆炸，造成人员伤亡和财产损失。因此，作业人员进行作业时，均应穿戴防静电服装和导静电鞋，或在门口配置静电消除装置。严禁携带任何易燃物品。严格按操作规程操作。

6、车辆相撞发生烟花爆竹爆炸

事故经过:2007年9月15日，湖南省一辆满载烟花爆竹运输车在货运过程中与其他车辆相撞发生爆炸，造成10人死亡。

事故原因：湖南省安化县“9·15”特大烟花爆竹爆炸事故原因基本查明：因驾驶员疲劳驾驶在货运过程中与其他车辆相撞发生爆炸起火引燃整车烟花爆竹爆炸，造成10人死亡。

预防措施:严禁疲劳驾驶。

7、触电事故案例

事故经过:2003年2月1日上午广东省罗定市太平镇发生烟花爆竹爆炸事故,同时影响电力线路触电,导致7人死亡、21人受伤。

事故原因:据了解,当天上午1时40分左右,一名儿童在太平镇太平一桥处点燃刚买来的烟花玩耍,不小心将旁边的一片烟花摊档引燃,引发烟花爆竹爆炸。人群躲避将旁边的2辆摩托车挤倒,油箱中的汽油渗出,再次引发大火,大火将旁边密集电力线路烧断,导致过路行人多人触电,共造成7人死亡,21人受伤。

预防措施:加强危险物品的库存管理,在事故现场及周边可波及范围内,紧急疏导群众撤离。在销售场所,烟花摊档摆设无药样品,有药产品放入专用仓库。

8、江阴市南闸花炮厂仓库维修时发生爆炸

事故经过:1998年8月27日12时45分,江阴市南闸花炮厂仓库维修时发生爆炸,造成一人死亡,一人重伤。

事故原因:维修人员在维修仓库屋面时吸烟,不小心将烟头丢入仓库内导致烟花爆竹燃烧爆炸,维修人员受惊从屋面跌落,造成一人死亡,一人重伤。

预防措施:仓库维修前应对维修人员进行安全培训教育,安全员应跟班作业。

9、中毒窒息事故案例

事故经过:1993年12月28日,广西合浦县公馆炮竹厂第一生产区烟花一车间发生爆炸事故。死1人,伤1人,引起周围工房殉爆,

伤 5 人，2 人休克。

事故原因：该起爆炸事故中，1 人死亡原因是爆炸冲击波，受伤人员原因有冲击波致伤、有爆炸抛撒物砸伤，还有多人是在车间内由于烟花爆竹燃烧爆炸产生大量含硫烟雾，且爆炸使工房倒塌封堵逃生路口，致使狭窄空间内充满大量有毒烟雾，致使在事故现场的多人由于中毒和窒息而受伤。

预防措施：作业场所内保持足够的疏散通道并保持良好的通风状态。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元的划分

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）结合评价对象实际情况，本次评价将对象划分为以下几个评价单元：

- 1、资料审核单元
- 2、总体布局和条件设施单元
- 3、现场检查单元
- 4、安全防护设施评价单元
- 5、周边环境危险性评价单元
- 6、重大事故模拟分析单元
- 7、安全经营条件评价单元

4.2 评价方法及选择

根据公司烟花爆竹仓库的具体情况、特点及储存的物质特性，结合考虑各种评价方法的适用范围，本次评价采用以定性、定量评价为主，结合其他评价方法的综合评价方法。具体采用评价方法见下表4-1。

表 4-1 各评价单元选用的评价方法汇总表

单元 \ 评价方法	安全检查表法（SCL）	事故后果模拟分析法
资料审核单元	√	
总体布局和条件设施单元	√	
现场检查单元	√	
安全防护设施评价单元	√	
周边环境危险性评价单元	根据现场实际情况进行论述	
重大事故模拟分析单元		√
安全经营条件评价单元	根据相关文件和现场实际情况进行论述	

5 定性、定量评价

5.1 资料审核单元安全评价

资料审核评价包括公司组织机构、从业人员、规章制度及相关技术资料等方面的情况，本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 A.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表》对被评价单位提供的资料审核评价，评价过程见下表。

表 5-1 资料审核表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	组织机构	法人条件证明	公司已取得营业执照，有独立的法人资格	合格
		安全生产组织机构	有安全生产组织机构，任命了专职安全员	合格
		产品质量检测检验管理机构	设置了产品质量检测职能部门	合格
		保卫组织机构	设置了仓库保卫组织机构	合格
		应急救援组织	有应急救援组织	合格
2	从业人员	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗证	主要负责人、安全管理人员经培训考核合格，取得资质证书。	合格
		守护员、保管员培训考核上岗资格证明	经主管部门组织培训考核合格，取得上岗资格证明。	合格
		驾驶、押运人员资格证明	厂家配送至仓库，由厂家委托有资质单位、车辆、人员配送，仓库配送至零售店为厢式货车。	合格
		其他从业人员培训上岗资格证明	由企业内部培训后上岗	合格
		从业员工工伤保险名单	为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险	合格
3	规章制度	安全生产责任制度	有安全生产责任制度	合格
		安全管理责任制度	有安全管理责任制度	合格
		隐患排查整改制度	有隐患排查整改制度	合格
		安全设施设备管理制度	有安全设施设备管理制度	合格
		从业人员安全教育培训制度	有从业人员安全教育培训制度	合格
		安全目标管理与奖惩制度	有安全生产奖惩制度	合格
		动火作业管理制度	有防火（动火）管理制度	合格
		安全投入保障制度	有安全投入保障制度	合格
		安全检查制度	有安全检查制度	合格
安全操作规程	有安全操作规程	合格		

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全验收评价报告

		重大危险源评估与监控措施	不属于重大危险源，不涉及重大危险源管理制度	不涉及
		产品流向登记管理制度	有产品流向登记管理制度	合格
		产品入库检验验收制度	有产品入库检验验收制度	合格
		不合格产品处置制度	有不合格产品处置管理制度	合格
		隐患排查整改和事故记录	有隐患排查整改和事故记录	合格
		事故应急救援预案	有事故应急救援预案，进行了备案，有备案回执	合格
		其他相关资料	还制定了值班岗位管理制度、企业负责人带值班制度	合格
4	技术资料	设计说明书	库区经设计后建造	合格
		平面布置图	有库区总平面布置图	合格
		库房施工设计图	库房经设计后施工，有相关图纸	合格
		安全设施和设备清单	库区设安全设施设备	合格
		消防设施和设备清单	库区设消防设施设备	合格
		主要生产设施和设备检验合格证明	防雷设施经常州市防雷设施检测所有限公司检测合格，防雷检测报告有效期为2023年12月6日，防静电接地检测报告有效期为2023年6月6日。	合格
		特种设备检验合格证明	无特种设备	合格
		配送运输车辆情况	厢式货车	合格
资料审查结论意见		符合安全条件		

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格，符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，不符合安全条件；

评价小节：资料审查符合安全条件。

5.2 总体布局和条件设施单元安全评价

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表》和《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 对仓库选址及总体布局单元检查评价，评价过程见下表 5-2。

表 5-2 总体布局和条件设施单元现场检查表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	总体布局	选址	库区选址避开了居民点、学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路、高压输电线路等，外部安全距离范围内没有设置建筑物，符合规范要求	合格

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全验收评价报告

		围墙	库区设置 2 米高的实体围墙，围墙与库房间距大于 5m，围墙附近已清除杂草。	合格
		功能分区	库区分为仓库区，设置值班室等；烟花爆竹仓库区，设立 1.3 级仓库。功能区域划分合理，见库区平面布置图	合格
		建筑物危险等级划分和布置	1 号仓库储存 C、D 级成品的烟花爆竹仓库，危险等级为 1.3 级。	合格
		危险品运输通道	库区内、外部运输通道通畅，无关人员和车辆不通过库区。	合格
		值班室	办公室（含值班室）位于库区北侧，距最近 1 号仓库 83m，符合规范要求。	合格
		外部安全距离	具体见表 5-4，符合规范要求。	合格
		安全疏散条件	1 号仓库面积为 713.26m ² ，设置 2 个防火分区，设 8 个安全出入口。每个仓库内任一点至安全出口的距离均不大于 15m。	合格
2	条件和设施	库区主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度	库区运输道路的宽度约 5m，库房装卸场地坡度小于 6%，符合要求。	合格
		消防设施、消防水源、水量、保护范围、补充时间	库区消防水源充足，配备了消防水池、消防桶、灭火器等消防设施及器材，消防水源充足。	合格
		安全监控保卫设施和固定值班电话	库区已配备了防爆视频监控探头，现场勘查时值班室内主机尚未安装，视频系统未调试，办公室尚未配备固定值班通讯设备。经整改后，监控主机和固定通讯电话均已安装，且运行正常，符合要求	合格
资料审查结论意见		符合安全条件		

注：a) 本表所列的审核和检查项目，全部合格，符合安全条件；

b) 本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，不符合安全条件。

经检查，总体布局和条件设施符合安全条件。

5.3 现场检查单元安全评价

本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 C.3 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表》和《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 对被评价单位烟花、爆竹仓库现场情况进行检查评价，评价过程见下表 5-3、表 5-4。

表 5-3 库区内部距离检查表 单位：m

序号	建筑物名称	危险等级	计算药量 (kg)	值班室 (m)		符合情况
				最小允许距离	实际距离	

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全验收评价报告

1	1号仓库	1.3	10000	78	83	符合
---	------	-----	-------	----	----	----

表5-4 库区各建构物外部距离检查表 单位：m

序号	建筑物名称	危险等级	计算药量(kg)	周边建(构)筑物		GB50161-2022要求的最小允许距离(m)	实际距离(m)
1	1号仓库	1.3	10000	东面	50人以下零散住户(邱氏宗祠)	78	123
				西南面	50人以下零散住户(土地宫)	78	112
				西北面	10kV架空电力线	35	78
				北面	50人以下零散住户(企业自用的办公楼)	78	83
				北面	村庄边缘(红朱田村-大山)	110	171

具体评价过程分别见以下表格 5-5。

表 5-5 烟花爆竹批发经营企业安全评价现场检查表

序号	项目	检查项目	检查情况	检查结论
1	定级定量	建筑危险等级	1号仓库为1.3级	合格
		核定存药量	1号仓库最大存药量为10t	合格
		内部安全距离	内部安全距离符合规范要求,见上表5-3	合格
		安全标志	符合要求	合格
2	建筑结构	建筑设计和结构	库房四周为砖混结构	合格
		建筑防火等级	防火等级为二级	合格
		门的开启方向、宽度、数量以及与其他建筑物门的对应方向	库房单层门,向外开启,门宽约2.1m	合格
		窗的结构、材料以及开启方向	上侧高窗采用塑钢窗,平开并设置了铁栅栏及金属网;下侧窗为固定式百叶窗加金属网,经整改后,下侧通风窗已配备可开启的防护板	合格
		屋盖的材料、结构	岩棉夹芯彩钢板屋面	合格
		墙的结构、厚度,内墙面、梁或过梁的设计等	仓库为砖混结构,24cm墙,内墙面光滑,设有钢筋混凝土梁	合格
地面阻燃性、柔性、导静电性能	采用水泥地面	合格		

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全验收评价报告

		仓库防潮、隔热、通风与防小动物	通风窗已设防小动物进入的金属网,库房建设时地基已考虑防潮措施,库房内设置了上下通风窗	合格
3	疏散要求	安全出口的数量,设置方向和位置,疏散距离	1号烟花爆竹仓库8个安全出口。每个仓库内任一点至安全出口的距离均不大于15m	合格
		建筑物内的通道宽度	建筑物内主通道1.5m	合格
		门口的台阶及坡度	未设置台阶	合格
4	人员	核定数量	1号库房定员为8人	合格
		培训和上岗证	培训考核合格,取得合格证书	合格
		衣着	员工衣着为棉制品,符合要求	合格
		防护用品及材质	防火用品的材质为棉制品	合格
		年龄及身体状况	员工的年龄和身体状况符合规范要求	合格
5	消防	设施、器材的配置和检验	仓库配备了灭火器、消防蓄水池、消火栓、消火水带、水泵	合格
		防火设备和措施	库区配有消防沙池、灭火器等消防设施	合格
		电器设备的选型与安装	库房未采用电气设备	不涉及项
		电器照明的选型与安装	库房内未设置照明设施	不涉及项
		电线的选型、连接和敷设	电气线路符合要求	合格
		建筑物的防雷	仓库设置了防雷设施,符合标准要求	合格
		设备和电器的接地	消防水泵外壳已做接地处理	合格
		设备的检修和维护	消防水泵检修和维护良好	合格
6	贮存与运输	产品堆垛的高度和堆垛间距(每个堆垛边长不应超过10m。堆垛与内墙壁之间距离宜不小于0.45m,堆垛与堆垛之间的距离不应小于0.7m。成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。)	现场勘查时库房内尚未划堆垛线及垛高线,经整改后,产品堆垛的垛高线和堆垛间距线符合要求	合格
		运输通道的宽度	未划设运输通道,经整改,通往安全出口的主通道宽度大于1.5m	合格
		库房地面防潮措施	库房地面采用水泥地面,库房地基抬高,进行防潮处理	合格
		库房内温度、湿度、通风的控制	库房内设置温湿度计及记录本	合格
		机动车库区行走路线和装卸	库区内机动车行驶线路畅通,符合安全要求。经整改后,装卸站台已设防撞缓冲装置	合格

7	制度	岗位安全管理制度	有岗位安全管理制度	合格
	规程	岗位安全操作规程	有岗位安全操作规程	合格
烟花爆竹仓库现场检查结论意见			符合安全条件	

注：a) 本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b) 本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

烟花爆竹仓库现场检查结论：各建构筑物内、外部距离、现场情况均符合要求。

5.4 安全防护设施评价

库区安全防护设施包括消防设施、应急救援设施、防雷防静电设施、防盗报警设施、安全警示标志等，该企业配备的安全设施、消防设施、应急救援设施见表 5-6。安全防护设施评价过程见下表 5-7。

表 5-6 安全设施、消防设施、应急救援设施清单

序号	设备设施名称	数量	存放位置
1	警戒线	2 卷	库区内
2	移动式应急照明灯	2 个	库区内
3	急救药箱	1 个	库区内
4	警戒路桩	6 个	库区内
5	防护服	4 套	库区内
6	防护鞋	4 套	库区内
7	安全帽	6 个	库区内
8	灭火毯	4 条	库区内
9	人体静电消除器	4 个	库房门口
10	各种警示牌（车辆限速、仓库标识牌、堆码线、安全标志等）	若干	库区内
11	灭火器（MFTZ35kg）	2 只	库区内
12	灭火器（MFZ/ABC5kg）	16 只	库房门口
13	灭火器（MFZ/ABC4kg）	6 只	办公室
14	消防泵（XBD4.5/25G-L）	2 台	消防泵棚
15	消火栓	3 个	库区内
16	消防水带	3 盘	库区内
17	消防水池	>270m ³	库区内
18	防爆摄像监控设备	9 个	库区内
19	库房入侵报警系统	1 套	库房
20	避雷带	1 套	库房
21	温湿度表	2 只	库房内

表 5-7 安全防护设施检查表

序号	检查内容	检查情况	检查结论
----	------	------	------

1	库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定	库区配备了消防水池、消防水泵，消防水源充足，还配备了灭火器等消防器材，消防设施配备符合要求。企业烟花爆竹仓库建筑工程的消防设施于2022年12月20日经泰顺县住房和城乡建设局消防验收，并出具验收合格的意见（泰住建消验字（2022）第0012号）。	合格
2	防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定	库区防雷防静电设施设置符合要求，经防雷检测公司检测合格。	合格
3	防盗报警等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定	库区设置视频监控系统，终端设在办公室（含值班室）内。	合格
4	库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定	库房未设置照明以及电气设施	合格
5	其它安全设施	库区设置了明显的安全警示标志，库区外请设置了内容齐全的警示标识牌。库区出入口已设置限速标示牌。在库区外，值班人员配备手机保持联系	符合
安全设施现场检查意见		符合安全条件	

注：a) 本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b) 本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

c) 企业于2022年12月9日委托了浙江智科工程检测有限公司对烟花爆竹仓库的建筑消防设施进行了检测，显示消防供配电设施、消防水源和供水设施、消火栓给水系统、防火分隔设施、灭火器配置进行检查测试，经检测全部合格。

5.5 周边环境危险性评价

5.5.1 库区内存在的危险、有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

根据第三章项目主要危险有害因素分析结果可知，建设项目烟花爆竹仓库储存的烟花爆竹全部为易燃、易爆物质，其运行过程中存在的主要危险因素是发生火灾爆炸事故。因库区外表距离均符合规范要求，故库区发生的火灾爆炸事故对周边人员活动影响较小。

但库区发生的火灾爆炸事故时产生的烟尘、气味会对周边环境如环境空气等造成一定程度的污染。

5.5.2 周边单位生产、经营活动或居民生活对库区的影响

建设项目其他周边建筑物距离在安全范围之外，对库区造成危害的危险源较小。

5.5.3 自然环境对库区可能产生的影响

根据当地自然条件分析，项目烟花爆竹仓库选址所处地域不存在洪涝灾害影响，其自然条件、地质、水文等，对项目建设基本无影响。

当地自然条件对项目存在的主要影响的是雷电影响，如防雷设施接地失灵，在雷雨季节遭到雷击会发生爆炸燃烧。本项目取得常州市防雷设施检测所有限公司出具的防雷装置检测检验报告，符合要求。只要采取了相应的安全措施，自然条件的不利影响是可以避免的。

周边环境危险性评价结论：由以上分析可以看出周边环境危险性风险可控。

5.6 重大事故模拟分析

火炸药爆炸能产生多种破坏效应，最危险、破坏力最强、破坏区域最大的是冲击波的破坏效应。重大事故后果分析法根据事故后果模型进行评价，以预测事故的死亡半径和受伤半径为主要评价指标。

5.6.1 爆炸死亡半径

爆炸死亡半径是指爆炸冲击波直接致人死亡的距离，在此距离以外由于爆炸点及殉爆点形成的射流、惰性介质(空气、水、土壤、金属、非金属等)冲射对房屋墙体、门窗、屋瓦、防爆堤的破坏以及飞溅的燃烧物、爆炸产生的有毒物质对人的作用也可能致人死亡。

现烟花爆竹储存仓库最大量仓库储存药量为 10000kg，选用事故后果模拟中的 Rakaczky 模型计算炸药爆炸冲击波对人员的伤害分

区。

死亡半径： $R_s=13.6 \times (WTNT)^{0.37}$

式中： R_s ——死亡半径（m）；

$$WTNT=E/(Q_{TNT} \times 1000)$$

式中： E ——爆源能量（J）；

Q_{TNT} ——TNT 燃烧热（ $4.52 \times 10^6 \text{J/kg}$ ）

对凝聚相炸药，爆源总能量 E 的计算公式为：

$$E=WQ$$

式中 W ——炸药的总质量（1000kg）

Q ——烟火药的燃烧热

烟火药按常用的高钾配方来估算烟火药的燃烧热 Q 。

反应方程式： $3\text{KClO}_4+8\text{Al}=4\text{Al}_2\text{O}_3+3\text{KCl}$

查得产物的生成热 $\text{KClO}_4=3 \times 452=1356 \text{ kJ}$

$$\text{Al}=0$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3=4 \times 1645=6580 \text{ kJ}$$

$$\text{KCl}=3 \times 444=1332 \text{ kJ}$$

燃烧生成物的总生成热： $Q_{\text{产}}=6580+1332=7912 \text{ kJ}$

反应物的总生成热： $Q_{\text{生}}=1356+0=1356 \text{ kJ}$

求得燃烧反应热 $Q_{\text{产}}-Q_{\text{生}}=7912-1356=6556 \text{ kJ}$

每克高氯酸钾与铝粉的混合药剂在燃烧反应中可释放的热量 Q
 $\text{释}=6556/(138 \times 3+27 \times 8)=10.40 \text{ kJ}$

同理可得每克高氯酸钾与硫磺的混合药剂在燃烧反应中可释放

的热量 $Q_{\text{释}}=1.0 \text{ kJ}$

烟火药的配方一般为 高氯酸钾：铝银粉：硫磺=5：2：3

因此估算得该公司烟火药的每千克的燃烧热为 $1000 \times 2/10 \times 10.40 + 1000 \times 3/10 \times 1 = 2.38 \times 10^6 \text{ J}$ 。

爆源总能量 $=WQ=10000 \times 2.38 \times 10^6 = 23.8 \times 10^9 \text{ J}$

因为爆炸产物的飞散和纸筒的炸开要损失部分能量，能提供产生冲击波的能量大致为总能量的 60%。则 $E=60\% \times 23.8 \times 10^9$

由于各类炸药放出的热量不同，根据能量相似原理换算成 TNT 当量，则 $WTNT=E/(Q_{\text{TNT}} \times 1000)=3.16$

则死亡半径 $R_s=13.6 \times (WTNT)^{0.37}=20.8 \text{ m}$

5.6.2 重伤半径 R_z ：

重伤半径的判定标准为人所受的冲击波峰超压大于 44000Pa。

根据冲击波超压准则可用下述联立方程求得：

$$\Delta P_s (\text{atm}) = 1 + 0.156Z^{-3}$$

$$\Delta P_s (\text{atm}) = 0.137 Z^{-3} + 0.119 Z^{-2} + 0.269 Z^{-1} - 0.019$$

式中： $Z=R_z/(E/P_0)^{1/3}$

R_z 为目标至爆源的距离， P_s 为环境大气压，一个大气压 (atm) 约为 101300Pa。代入冲击波峰值超压 44000Pa 可得到重伤半径

$$R_z = 1.082 (E/101300)^{1/3}$$

求得 $R_z=56.3 \text{ m}$ 。

5.6.3 轻伤半径 R_0 ：

轻伤半径的判定标准为人所受到的冲击波峰代入冲击波峰值超

压大于 17000Pa，按上述方法可得：

$$R_s = 1.956 (E/101300)^{1/3} = 101.7\text{m}$$

重大事故模拟分析结果：死亡半径为 20.8m，重伤半径为 56.3m，轻伤半径为 101.7m，由此可见重伤半径范围内无其它企业、十户以下零散住户，风险可控。

5.7 重大事故隐患判定

根据国家安全监管总局关于印发《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知，企业重大事故隐患判定结果见表 5-8。

表 5-8 重大事故隐患判定检查表

序号	检查项目	实际情况	检查结果
1	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。	主要负责人、安全生产管理人员已持证上岗。	符合要求
2	特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。	特种作业人员已持证上岗，无带药检维修设备设施。	符合要求
3	职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。	无此项	无此项
4	工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。	库房作业人员数量已按核定人数定员。	符合要求
5	工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。	库房存储药量按核定药量存放。目前尚未储存烟花爆竹	符合要求
6	工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。	库房内、外部其他安全距离符合要求。	符合要求
7	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。	防静电、防火、防雷设备设施已安装。	符合要求
8	擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建	未擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建。	符合要求
9	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准	设置了 2m 高的实体围墙	符合要求
10	将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。	无此项	无此项
11	在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。	无此项	无此项
12	中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。	无此项	无此项

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全验收评价报告

13	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，已制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	符合要求
14	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	未出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	符合要求
15	生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。	存放的产品种类、危险等级按许可范围经营。	符合要求
16	分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。	不涉及	不涉及
17	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。	不涉及	不涉及
18	许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。	不涉及	不涉及
19	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	烟花爆竹仓库未存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	符合要求
20	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。	不涉及	不涉及

重大事故隐患判定结果：该企业不存在重大事故隐患，符合要求。

5.8 安全经营条件评价

本节根据有关法律法规要求，检查公司安全经营条件是否符合法规要求，检查过程见下表 5-9。

表 5-9 安全经营条件评价检查表

序号	检查内容	实际情况	检查结论
1	各烟花爆竹批发经营公司必须设置符合国家标准烟花爆竹储存仓库，严禁租赁闲置库房或其他设施进行烟花爆竹储存	自有仓库	合格
2	严格执行烟花爆竹建设项目安全许可审查制度。安全评价机构应按照安全生产行业标准《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）对烟花爆竹建设项目进行安全评价	本评价报告严格按照《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）要求对公司烟花爆竹经营条件进行安全评价	合格
3	各烟花爆竹批发经营公司所属储存仓库的仓库面积和危险等级必须与其经营规模和产品等级相匹配，烟花爆竹产品应按国家标准规定以 1.1 ² 、1.3 级分级分库储存	公司烟花爆竹仓库储存 1.3 级烟花爆竹产品	合格

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全验收评价报告

4	依据《烟花爆竹工程设计安全标准》(50161)的规定设置烟花爆竹仓储设施的内外部安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件以及消防、防爆、防雷、防静电等安全设施；库区设置符合安全生产行业标准的安全监控系统	公司库区的库房建筑结构、安全疏散条件均符合相关规范要求，按要求设置消防、防爆、防雷、防静电等安全设施，并定期经相关部门检测合格	合格
5	各批发公司应配备烟花爆竹中氯酸钾定性分析快速检测试剂，对每一批省内外购进的烟花爆竹产品进行严格检验，发现问题及时上报相关部门	目前尚未储放烟花爆竹，公司购进的烟花爆竹产品要求供货方提供产品合格证，应保证每一批产品的质量合格。	合格
6	公司应制定台帐和对抽查结果进行记录，做好日常档案管理工作。实现对烟花爆竹产品进行流向控制，阻断非法或违规产品进入消费市场	公司已制定台账记录制度，对烟花爆竹产品流向进行登记，进行流向控制	合格
7	建立健全安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程；设置安全管理机构或者配备安全管理人员	公司已制定安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程，设置安全管理机构	合格
8	主要负责人或安全管理人员应当具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格；仓库报关员、守护员应当接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格；其他从业人员应当经过本单位的安全知识教育和培训	公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员已取得考核合格证，其他从业人员经公司安全培训	合格
9	具备专业烟花爆竹批量配送服务能力，其运输车辆符合国家标准并取得相应资质	厢式货车进行烟花爆竹配送	合格
延证换证条件检查结论		符合经营条件	

注：a) 本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b) 本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

检查结果：安全经营条件符合要求。

5.9 综合评价结果

1、资料审核情况

通过评价组现场检查、资料收集审核，该项目的资料审核符合《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的相关要求。

2、总体布局和条件设施评价

从《总体布局和条件设施单元现场检查表》检查结果可以看出，库区条件符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的相关要求。

3、现场安全检查评价

烟花爆竹仓库现场检查结论：各建构筑物内、外部距离符合要求，现场检查项目符合安全条件。

4、安全防护设施评价

从《安全防护设施检查表》可以看出，库区安全防护设施设置符合安全条件。

5、周边环境危险性评价

周边环境对库区的主要危险性因素是人的因素，主要是人为性火灾、其它场所发生火灾对烟花爆竹仓库的影响。因此库区应配备足够的消防器材，保证足够的防火间距，安全疏散通道、安全出口的设施应符合规范要求，并加强库区的安全管理。周边环境危险性风险是可控的。

6、重大事故模拟分析结果：死亡半径为 20.8m，重伤半径为 56.3m，轻伤半径为 101.7m，由此可见重伤半径范围内无其它企业、十户以下零散住户，风险可控。

7、重大事故隐患判定结果：该企业不存在重大事故隐患，符合要求。

6 安全对策措施及建议

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司根据《安全生产法》和《烟花爆竹经营许可实施办法》的有关要求，建立了较完善的安全管理组织，明确了各级人员安全生产责任制，制定了各项安全管理制度的安全操作规程。本报告针对公司储存过程提出以下安全对策措施。

6.1 安全对策措施、建议的依据及原则

1、安全对策措施的依据：

- 1) 物料危险、有害因素的辨识分析；
- 2) 符合性评价的结果；
- 3) 国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

- 1) 安全技术措施等级顺序：
- 2) 直接安全技术措施；
- 3) 间接安全技术措施；
- 4) 指示性安全技术措施；
- 5) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

3、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

4、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

5、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

6、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

6.2 《安全设施设计》提出的安全对策措施核查

参照现场情况和各项技术资料，对该项目《安全设施设计》中提出的主要对策措施核查，核查情况见表 6-1。

表 6-1 《安全设施设计》中提出的安全对策措施落实情况核查表

序号	项目	分项目	核查结果
1	防范自然条件影响的安全措施	防洪、防地质灾害的安全措施	附近水塘、溪流较多，水位稳定，受山洪的影响较小。库区场地属丘陵山地地貌，原始地形起伏一般，自然山坡坡度 20° 左右，植被发育，地面高程在 672.0~682.0m 之间。场地现状已进行山体开挖及回填处理，场地基本平整，高程为 675.22~675.95m。场地外围北侧、东北侧开挖后形成人工挖方边坡，高度约 5~20m，场地南侧、东南侧周边地段多为人工填方边坡，高度约 10~30m。
		防雨、防台风的安全措施	侧墙设置女儿墙，屋面采用轻质夹心彩钢瓦，室内地面架空，仓库设有雨水管，通过雨水管排向附近水塘或溪流。
		防山火的安全措施	本项目在距离仓库外墙四周 5m 内设置防火隔离带，应定期对灌木和杂草进行伐除和清理。
		防地震安全措施	抗震措施按设防烈度 7 度、抗震等级三级采用。
		本项目 1 号仓库的防雷类别为二类，办公楼-值班室的防雷类别为三类，按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求，采取防直击雷、防闪电感应以及防闪电电涌侵入的措施。 （1）防直击雷、防闪电感应和防闪电电涌侵入措施 ①建筑物屋面设置接闪带和接闪网。	已采纳，且防雷防静电设施已经常州市防雷设施检测所有限公司检测合格。

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全验收评价报告

		<p>②建筑物的接闪带采用Φ12圆钢，绕屋面女儿墙顶（或屋檐顶）一周，用支持卡固定；支持卡高于女儿墙（或屋檐）150mm，间距为1m，其中转角处为0.5m；接闪网采用Φ12圆钢，在屋面上明敷，网格不大于10m×10m或12m×8m；引下线采用建筑物四周的混凝土柱内2根Φ16主筋，其间距不大于18m。</p> <p>③将建筑物的金属屋面、混凝土柱内钢筋、基础底筋全部焊接成闭合回路，与室内接地干线连通，仓库内所有通风窗及勒脚处进风窗上的铁栅栏和金属网及金属门轴也与室内接地干线连通，防止闪电感应和闪电电涌侵入。</p> <p>（2）接地措施</p> <p>建筑物的防直击雷与防闪电感应、防静电共用接地系统，利用建筑物基础钢筋网自然接地，接地电阻不大于4Ω，防闪电感应的接地干线与防雷接地装置的连接不少于两处。</p>	
2	总平面布置和建筑设计安全措施	总平面布置安全措施	已采纳，符合GB50161-2022的要求。
		建筑设计安全措施	已采纳，符合GB50161-2022的要求。
3	电气、消防设计安全措施	电气设计安全措施	已采纳，防雷防静电设施已经常州市防雷设施检测所有限公司检测合格。
		消防设计安全措施	已采纳。
4	其他安全措施	<p>1) 库房内设置温、湿度计。</p> <p>2) 办公楼-值班室设置应急灯具。</p> <p>3) 办公楼-值班室设置固定电话一部，用于火灾报警。</p> <p>4) 按照《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）要求，在库区围墙外、库区出入口以及危险品仓库门口设置相应的禁止标志、警告标志、指令标志和指示标志。</p> <p>5) 库区采用“人防、物防、技防”相结合的安全防范系统。</p>	已采纳
5	安全管理措施	烟花爆竹产品安全与质量	已采纳
		烟花爆竹仓储运输	已采纳
		其他安全管理措施	已采纳
6	设计中采用的	检测报警设施：库区共配置1组红外	库区已安装了视频监控系统，共

	预防事故设施	防盗报警器，安装在库区出入口；8只监控摄像头，分别安装在库区出入口、库区周界、仓库门口装卸区。防盗报警和监控系统的控制主机设在办公楼。	9个探头，且已覆盖了整个库区。且安装单位已出具了试运行记录。
		设备安全防护设施	已采纳。
		安全警示标示	现场已按AQ4114设置安全警示标志。
7	设计中采用的减少与消除事故影响设施	防止火灾蔓延设施	已采纳，1号仓库已设置二个防火分区。
		灭火设施	已采纳。
		紧急个体处理设施	已采纳。

现场检查情况表明，本项目实施过程中，专篇中提出的安全对策措施已落实。

6.3 补充的安全对策措施及建议

- 1、企业应进一步明确经营和储运过程中各个环节的安全责任。
- 2、员工变更后应及时为新员工购买工伤保险或安全生产责任保险，以降低企业经营风险。
- 3、企业应密切注意，使仓库外部安全距离范围内不得有影响建筑物存在。如周边存在有新建项目可能影响库区安全距离，应加强协调或立即向管理部门报告；一旦有影响建筑物存在，应立即停止使用该仓库，经重新安全评价论证后确定风险程度。
- 4、企业应加强库区安全管理，采取防雷、防暑、防雨、防汛等安全措施，确保高温、雷、雨季烟花爆竹储存安全；要密切注意仓库内温湿度变化，及时做好通风防潮工作。
- 5、企业应加强防火、防爆、防雷、防静电设施的维护、保养和定期检测，确保设施良好和安全运行。确保库区条件始终能够满足烟花爆竹储存运输条件。

6、企业应加强操作人员的安全培训考核，并经常进行安全教育，努力提高职工的安全意识。员工变更后应及时组织新员工培训，力求人人持证上岗。对搬运员工要进行耐力训练和体能考核。

7、企业不得将经营权和库房非法转让、转租，以免构成重大安全隐患。企业不得超范围经营。

8、作业人员应按制定的安全生产规章制度、安全措施和操作规程严格执行，储存过程中严格按照规定的定员定量经营。

9、企业用工应按照劳动法的规定，严禁使用童工和老人。

10、建立不合格产品处置和跟踪制度，及时处理不合格产品。

11、企业应根据最近的行业动态和企业自身情况及时完善各项规章制度和操作规程，并严格执行。

12、库房内烟花、爆竹成品应按要求分级、分类进行堆放，危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m，堆垛的边长应小于或等于10m；搬运通道的宽度不宜小于1.5m。成品堆码高度不得超过2.5m。应根据不同产品的规格、药量调整堆码高度，防止超药量储存。

13、仓库应设置温湿度表，储存温度不应超过45℃，相对湿度不应超过85%。

14、应切实保障安全管理经费，做好年度预算，专款专用。

15、装卸作业时，仓库应留有备用疏散通道，装卸时不得超员作业。装卸平台装卸时应确认设置有缓冲装置，防止发生撞击产生火花。

16、要及时清理围墙外及库房周边杂草与杂物，保持在库房周围

及围墙外均有不小于 5m 的防火隔离带。如遇暴雨季节，库房四周雨水较大，建议库房周围设置排水沟。

17、对回收退库、变质、报废的产品应按安全规范要求定期处置。

18、依据 GB10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》，按照产品的药量，构成的危险性 A/B 级的产品和需加工安装的 C 级、D 级产品由取得专业燃放资质人员燃放。在特定条件下燃放的产品，无相应燃放资质的单位或个人不得购买和燃放。

19、企业是安全生产的责任主体。企业的主要负责人和安全管理人員应不断提高安全生产意识，关注安全形势，跟进安全生产法律法规标准规范，保持安全生产条件。

20、公司应安排到人，经常检查周围环境，收集当地政府主管部门发布的地质灾害、气象预警预报，一旦发现异常或灾害预警预报的气象条件涉及本项目所在地，应立即采取相应有效措施，甚至将库区内危险品移至安全地带。

6.4 应采取的安全对策措施及改进措施

6.4.1 整改意见

我公司评价人员于 2022 年 12 月对泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库进行现场检查，对库房存在的不符合安全要求之处提出以下整改意见：

表 6-2 整改建议

序号	现场检查发现的问题	整改建议	紧迫程度
1	现场勘查时值班室内主机尚未安装，视频系统未调试，办公室尚未配备固定值班通讯设备	安全监控系统安装完成并调试正常后，应按要求达到合格，办公室应配备固定值班通讯设备	高

泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库建设项目安全验收评价报告

2	下侧窗为固定式百叶窗加金属网，未设置可开启的防护板	下侧通风窗宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗	高
3	库房门口未设置消除人体静电装置。	库房的出入口处，应设置消除人体静电的装置，其接地电阻值不得大于 100Ω。	高
4	库房内尚未划堆垛线及垛高线，运输通道。	每个堆垛边长不应超过 10m。堆垛与内墙壁之间距离宜不小于 0.45m，堆垛与堆垛之间的距离不应小于 0.7m。成箱成品堆垛的高度不应超过 2.5m。仓库内通往安全出口的主通道的宽度不应小于 1.5m。	高
5	库房装卸平台未设置防撞设施	应增设缓冲设施防止车辆撞击产生火花。	高

6.4.2 整改复查情况

根据泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司整改回复，我公司对该烟花爆竹仓库的安全条件评价所提出的整改意见进行了复查，整改情况如下：

表 6-3 整改情况

序号	现场检查发现的问题	整改建议	整改情况	符合性
1	现场勘查时值班室内主机尚未安装，视频系统未调试，办公室尚未配备固定值班通讯设备	安全监控系统安装完成并调试正常后，应按要求达到合格，办公室应配备固定值班通讯设备	已设置	符合
2	下侧窗为固定式百叶窗加金属网，未设置可开启的防护板	下侧通风窗宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗	已设置	符合
3	库房门口未设置消除人体静电装置	库房的出入口处，应设置消除人体静电的装置，其接地电阻值不得大于 100Ω。	已设置	符合
4	库房内尚未划堆垛线及垛高线，运输通道	每个堆垛边长不应超过 10m。堆垛与内墙壁之间距离宜不小于 0.45m，堆垛与堆垛之间的距离不应小于 0.7m。成箱成品堆垛的高度不应超过 2.5m。仓库内通往安全出口的主通道的宽度不应小于 1.5m。	已设置	符合
5	库房装卸平台未设置防撞设施	应增设缓冲设施防止车辆撞击产生火花。	已设置	符合

从上表可以看出，现场检查发现的问题，已经按整改建议整改完成，符合要求。

7 安全评价结论

本次安全评价通过对泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库的危险有害因素分析、资料审核、总体布局、现场检查以及事故后果模拟分析,对于项目运行过程中可能发生的安全事故进行了系统分析与评价,得出如下结论:

7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类

1、本项目可能存在的危险、有害因素是:火灾、爆炸及物体打击、高处坠落等危险、有害因素,其中火灾爆炸最容易发生,且危险性最大。导致火灾爆炸事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸,此外,产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2、主要事故种类:火灾、爆炸。

7.2 安全评价结果

1、资料审核情况

通过评价组现场检查、资料收集审核,该项目的资料审核符合《烟花爆竹企业安全评价规范》(AQ4113-2008)的相关要求。

2、总体布局和条件设施评价

从《总体布局和条件设施单元现场检查表》检查结果可以看出,库区条件符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的相关要求。

3、现场安全检查评价

通过烟花爆竹仓库现场检查,各建构筑物内、外部距离符合要求,现场检查项目符合安全条件。

4、安全防护设施评价

从《安全防护设施检查表》可以看出，库区安全防护设施设置符合安全条件。

5、周边环境危险性评价

周边环境危险性风险是可控的。

6、重大事故模拟分析结果：死亡半径为 20.8m，重伤半径为 56.3m，轻伤半径为 101.7m，由此可见重伤半径范围内无其它企业、十户以下零散住户，风险可控。

7、重大事故隐患判定结果：该企业不存在重大事故隐患，符合要求。

8、该公司烟花爆竹最大储存量未超过国家标准 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》规定的重大危险源的临界量，未构成危险化学品重大危险源。

7.3 评价结论

为防止安全事故发生，进一步提高公司的安全管理水平，本报告对泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司从安全管理、安全技术两个方面提出了相应的要求和安全对策措施，建议该公司按照本报告提出的建议加强烟花爆竹仓库的储存、经营管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等法律法规及相关技术标准要求。

经过对泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库储存经营管理进行安全评价，评价组确认：**泰顺县合力烟花爆竹有限责任公**

司烟花爆竹仓库的外部环境状况、内部平面布置、储存条件、库区运输、仓库建筑结构、安全设施及仓库的安全管理，符合《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等国家有关安全生产的法律法规标准的要求，本安全评价总结论为：泰顺县合力烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库，1号仓库，危险等级为1.3级，储存C、D级烟花类产品、C级爆竹类产品，最大存药量为10000kg，储存设施及安全管理符合《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等国家有关安全生产的法律法规标准的要求，达到投入运行条件。

8 安全评价报告附件
